

# EINSATZ – ASZ FELDKIRCH

12.03.2024 BIS 13.03.2024

FEUERWEHR  
GISINGEN



## ALARMIERUNG – Zeitlicher Ablauf

- 17.48 Uhr Erstalarmierung **f3,r1** > „Brand im Bauhof > schwarzer Rauch“  
(FW Gisingen, FW Altenstadt, Rettungsabteilung Feldkirch)
- 17.52 Uhr Stichwörterhöhung auf **f4,r3**  
(zusätzlich FW Feldkirch-Stadt, FW Nofels)
- 17.53 Uhr Eintreffen am Einsatzort mit „**Gisingen KDOF**“
- 17.55 Uhr Eintreffen der ersten „zwei Tanklöschfahrzeuge“
- 17.56 Uhr Nachalarmierung **f5** (FW Tosters) und **f11** (FW Götzis – Steiger)
- 18.07 Uhr Nachalarmierung **f5** (FW Tisis)
- 18.11 Uhr Nachalarmierung **f11** (FW Mäder – ALF & ASSP)
- 18.13 Uhr Nachalarmierung **f11** (FW Rankweil – LUF & GTLF)
- 18.34 Uhr Information an ARA sowie Alarmierung der Rufbereitschaft Chemie

## SCHADENSLAGE

- Gebäude „ASZ Feldkirch“ in **Vollbrand**
- **Brandausbreitung** in Richtung Osten (Schutzdamm bereits in Brand)
- **Drohende Brandausbreitung** in Richtung Norden (Bürogebäude Stadtbauhof) bzw. in Richtung Süden (BP-Tankstelle)
- **Starke vertikale Rauchausbreitung**
- leichter Funkenflug in alle Richtungen
- Keine vermissten Personen, da Betrieb bereits geschlossen
- Keine akute Personengefährdung in unmittelbarer Umgebung



© Thomas Güfel

© Thomas Güfel

Fotos aufgenommen um **17.52 Uhr** > 4 min nach Alarmierung

## EINGESETZTE KRÄFTE

- FW Gisingen mit **55 Einsatzkräften**
- FW Altenstadt mit **30 Einsatzkräften**
- FW Feldkirch-Stadt mit **43 Einsatzkräften**
- FW Nofels mit **34 Einsatzkräften**
- FW Tosters mit **35 Einsatzkräften**
- FW Tisis mit **36 Einsatzkräften**
- FW Götzis mit **37 Einsatzkräften**
- FW Rankweil mit **47 Einsatzkräften**
- FW Mäder mit **11 Einsatzkräften**
  
- **9 Feuerwehren mit 35 Fahrzeuge und 316 Einsatzkräfte**
- **Rettungsabteilung FK, Bundes- und Stadtpolizei Feldkirch**

## TAKTISCHE GRUNDSÄTZE



### SICHERN

- Brandausbreitung, Hitzeabstrahlung
- Einsturzgefahr, Rauchgase
- Problemstoffe

### RETTEN

- Keine Menschen und Tiere in Gefahr

### AUSBREITUNG VERHINDERN

- Schutz der umliegenden Objekte

### GEFAHR BESEITIGEN

- Aufbau einer ausreichenden Löschwasserversorgung
- Ablöschen des Objektes
- Abbruch mit Hilfe von Radbaggern
- Nachlöscharbeiten

# EINSATZ – ASZ FELDKIRCH

12.03.2024 BIS 13.03.2024

FEUERWEHR  
GISINGEN




## EINSATZABLAUF & -PLANUNG

1. Erkundung gemeinsam mit Bauhofleiter **GÜFEL** Thomas
2. Nachalarmierungen durchführen durch **Einsatzleiter FW Gisingen**
3. 1. und 2. TLF zur Objektsicherung und Brandbekämpfung ins Bauhofgelände
4. 3. und 4. TLF zur Objektsicherung und Brandbekämpfung ins Tankstellengelände
5. **Aufstellflächen** vor dem Brandobjekt freihalten für DLK 23/12 und TMB 45
6. **Trümmerschatten** aufgrund umfallender Gebäudeteile freihalten
7. **Abschnittsbildung** „Abschnitt Tunnel“ bei Ankunft des nächsten Führungsfahrzeuges
8. **Nachbarobjekte schützen** bzw. bereits in Brand geratene Teile (Schutzdamm) ablöschen
9. **Ausreichende Löschwasserversorgung** für Löscheinsatz aufbauen (Hydranten + Kanal)
10. **DLK 23/12 + TMB 45** in „sicherer Position“ in Stellung bringen
11. **Brandbekämpfung** mittels umfassendem Außenangriff

## EINSATZABSCHNITTE



## LÖSCHWASSER

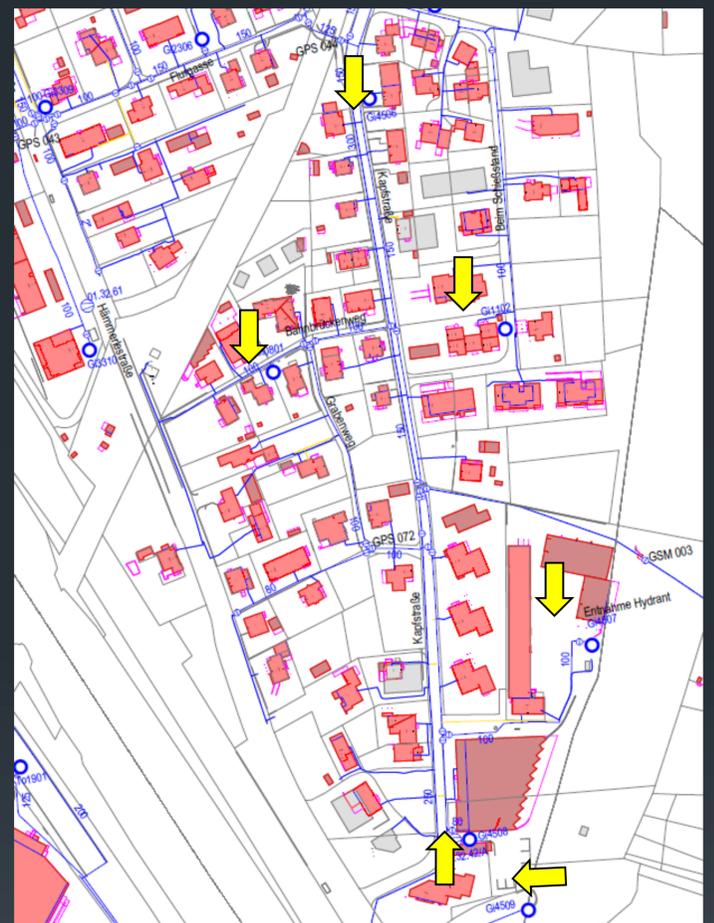

ca. **10.000 Liter /min** Löschwasserbedarf

- 6.400 Liter/min für ca. 2 Std. aus 6 Hydranten
- 3.600 Liter/min für ca. 2 Std. aus Betriebskanal der FM Hämmerle über 3 TS 12

